

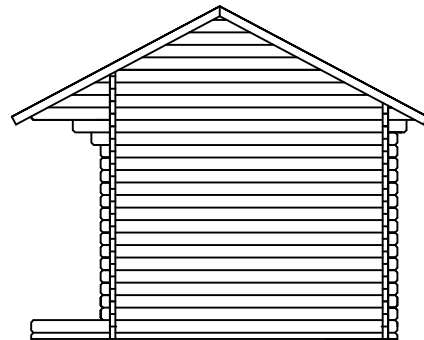


Luoman Tiainen

15P-2

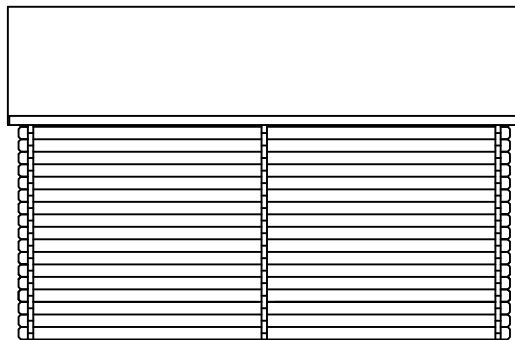

Bygганvisning

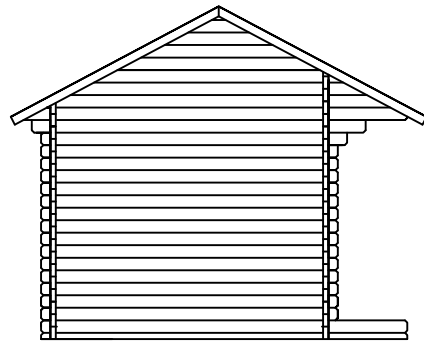

Takuunumero:
Garantinummer:
Garantinummer:
Garanti nummer
Warranty number:
Le numéro de garantie:

Pidä numero tallessa.
Behåll numret.
Bewahren Sie die Nummer auf.
Hold nummer.
Keep the number.
Le numéro de garantie.



MONTERINGSANVISNING

Förord

Bästa byggare, tack för att du har valt denna timmerprodukt. Var vänlig och läs dessa instruktioner noggrant före monteringen och bevara dem för senare bruk.

Garantivillkor för denna produkt

Villkoren för garantin gäller inte ifall att:

- Kunden inte har följt instruktionerna.
- Kunden har modifierat delarna.
- Paketet har inte förvarats på rätt sätt efter leveransen.
- Monterade produkten är inte ytbehandlat på rätt sätt strax efter monteringen.
- Fundamentet är inte gjort enligt anvisningarna.

Garantin är giltig ifall att:

- En del har ett produktionsfel
- En del inte lämpar sig för dess tilltänkta syfte.
- En del inte motsvarar informationen som angivits innan köpet.
- En del håller en kortare tid än vad som är antagbart.

Fråga ditt lokala byggnadskontor på förhand vilka byggnadslov du behöver.

Mottagning och lagring av varan

Färdigbearbetade lättstockar och andra delar har packats i förpackningsplast. Om inte produkten byggs upp genast, borde materialet lagras inomhus eller annars vältäckt. Förpackningsplasten ska inte tas bort. Ett lagrat föremål behöver lyftas upp ordentligt från marken för att förhindra markfuktigheten från att tränga in i paketen. Underlaget måste vara plant.

För transportsador och brister ska en markering göras i fraktsedeln. När lasset lastas av bör man kontrollera att leveransen stämmer överens med fraktsedeln. På samma gång beaktas möjliga transportsador. Bristerna och skadorna markeras i fraktsedeln och meddelas genast till leverantören.

Av förpacknings- och transporttekniska skäl placeras timret och annan trävara i paketet så att buntarna blir passligt stora. Därför är timmerstockarna inte nödvändigtvis i monteringsordning i paketen.

Om möjligt, lagra fönstren och dörrarna inomhus.

Kontrollera innehållet med komponentlistan. Om någonting saknas eller är trasigt, kontaktas försäljaren omedelbart.

Sortera delarna i närheten av byggplatsen, så att det lämnar tillräckligt med rum att jobba runtomkring.

1. Kontrollera förpackningens innehåll

2. Använd komponentlistan för att registrera eventuella delar som saknas eller är defekta.

3. Kontakta din återförsäljare vid behov.

Klagomålsprocedur i händelse av eventuellt fel

Om du har något att klaga på gällande produkten, kontakta återförsäljaren omedelbart och gör ett skriftligt klagomål. Informera återförsäljaren om garantinumret, som finns på paketet. Vi kan inte behandla reklamationen utan garantinumret. Om monteringen börjas eller fortsätts, har kunden godkänt produkten. Tillverkaren och återförsäljaren förbehåller sig rätten att själv fatta alla beslut vad gäller klagomålet. De förbehåller sig även rätten att vid behov besöka byggplatsen. Tillverkaren eller återförsäljaren ansvarar inte för några indirekta kostnader/skador som orsakas av att någon produkt/del av produkt saknas eller är defekt.

Materialdefinitioner

Trä är ett naturligt material med uppenbara och tillhörande egenskaper, såsom kvistar och kvistgrupper, sprickor, hårfina sprickor i kvistar, kåda och vridkraft. Detta innebär att lösa kvistar eller kvisthål i kanterna kvistsprickor, torrsprickor och hårfina sprickor, som inte påverkar konstruktionen är godtagbara. Även vridna delar, om dessa fortfarande är användbara, och kåddefekter kan även godtas. Hyvlingsdefekter och vankanter på undersidan av tak- och golvbrädor godtas utan begränsningar, om det fortfarande är möjligt att montera den synliga sidan inne i byggnaden.

Montering av timmerstommen

Byggaren ansvarar för byggnadens lämplighet för det tilltänkta syftet.

Byggandet av denna byggnad kräver yrkesskicklighet och förtrogenhet med bestämmelserna som berör byggnaden och byggande. Byggaren antas följa gott byggnadssätt. Använd dig vid behov av sakkunniga och experter inom byggbranschen som hjälp.

Monteringsinstruktionerna innehåller en förteckning på delarna, väggscheman och de nödvändiga detaljritningarna.

En del av timmerstockarna har försetts med stockens kod med penna i knuten för att underlätta stockens identifiering. Alla stockar har inte en kod, och de måste identifieras på basis av längden och knutarna. En del av stockarna har borrade hål av produktionstekniska skäl, fast hålen inte skulle behövas.

Fundament

Byggnadens grund ska vara tjälfri och den får inte sjunka ned.

Det finns olika sätt att grundlägga byggnader, och grunderna ska göras i enlighet med grundens förhållanden. Använd dig av experthjälp då du väljer och planerar grundläggningssättet. En separat plan om grunderna ska göras vid behov. Byggnaden måste fästas vid grunden. Beakta att väggarna kommer enligt ritningarna att nå cirka 5 mm utanför sockelytan.

Med instruktionerna följer en måttritning för pelargrundläggning.

Timmerstommen

Det att virket sätter sig är en naturlig del av timmerbygge, och det beaktas när strukturerna planeras och monteras. När de lätta stomkonstruktionerna såsom mellanväggarna, trapporna, armaturen och pelarna kopplas ihop med timmerstockstrukturerna bör man beakta att timret kommer att sätta sig. Strukturerna som inte kommer att sätta sig förses med sänkningsmån

Leveransen kommer med en **reservstock**. Stocken är menad som reservstock om någon av stockarna har bearbetningsfel eller en stock är annars skadad eller fel längd. Reservstocken sågas av till rätt längd på bygget. Vid behov kan reservstocken också förses med knut på bygget. Stocken kan göras till flera reservdelar. **Observera! Knuten bearbetas med handsåg och till exempel stämjärn. Ta mått och modell av en färdig knut.**

Bastun

Vid byggandet av en bastu måste byggaren alltid beakta de bestämmelser som gäller bastuugnar och rökgångar. Strukturerna har inte gjorts med tanke på kraven på en bastuugn och rökgång. Bastuutrymmet ska vädras tillräckligt. Ytterväggarna kan förses med hål som behövs för ventilationsventilerna.

I bastuutrymmena ska särskild uppmärksamhet riktas på ytbehandlingen av golvbrädorna.

Tilläggsisolering

Värmeisoleringsmaterial hör inte till leveransen. När du använder värmeisoleringsmaterial, följ instruktionerna och bestämmelserna som gäller dem. Var särskilt uppmärksam med ångspärren och tillräcklig vädring, om sådant krävs.


Skyddsbehandling

Virket som används för Luoman-produkter är obehandlat. Ytbehandling av byggnaden bör göras omedelbart efter att man uppfört byggnaden men så att väder och förhållanden tillåter detta. Byggnadens inre delar ska också behandlas. Första behandlingen bör göras med ett färglöst träimpregneringsmedel som förhindrar mögel och blånadssvamp. Behandla timmerytorna endast med produkter som är avsedda för timmerytor. Fråga efter tips om passliga ytbehandlingsprodukter hos försäljarna av sådana produkter.

Såväl på obehandlade som på behandlade träytor uppstår i vissa förhållanden lätt små svarta eller grå mögelfläckar. Mögelfläckarna är inte skadliga för träet eller ett fel i det. Problemet är estetiskt, och oftast kan möglet tvättas bort som smuts. Fläckarna kan också slipas bort innan träet ytbehandlas.

Skötsel

Ett tryggt och långvarigt bruk av stugan förutsätter regelbunden kontroll av delarnas fästen och skick samt underhåll vid behov (gäller speciellt takkonstruktion, takmaterial, dörrar och fönster, stugans fastsättning till grunden, stormsäkring, skyddsbehandling). Försummelse av kontroll och underhåll kan skada byggnaden eller utgöra en säkerhetsrisk för användaren. Regelbunden kontroll av skyddsbehandlingen och förnyelse vid behov är viktigt. Kontrollera speciellt nedre delarna av dörrar och fönster och deras karmar, ändar av delarna och delar som utsätts för kraftig förslitning. Kontrollera dörrarnas och fönstrens funktion och justera gångjärnen vid behov. Kolla också silikonfogarna hos dörrar och fönster och förnya dem vid behov. Speciellt viktigt är det att se till att stugans och grundens ventilation fungerar väl.

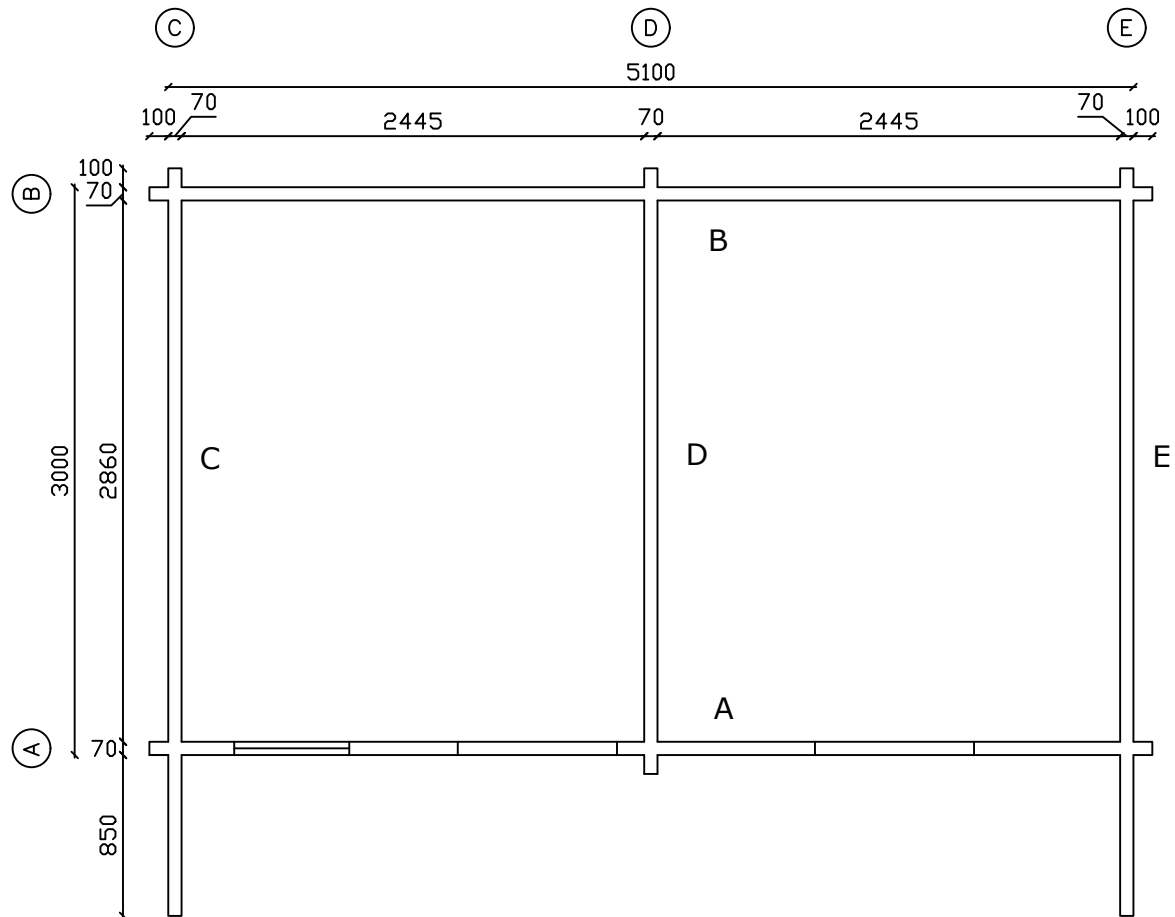

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com





proj.
 Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
 grundplan

skala
 ej i skala

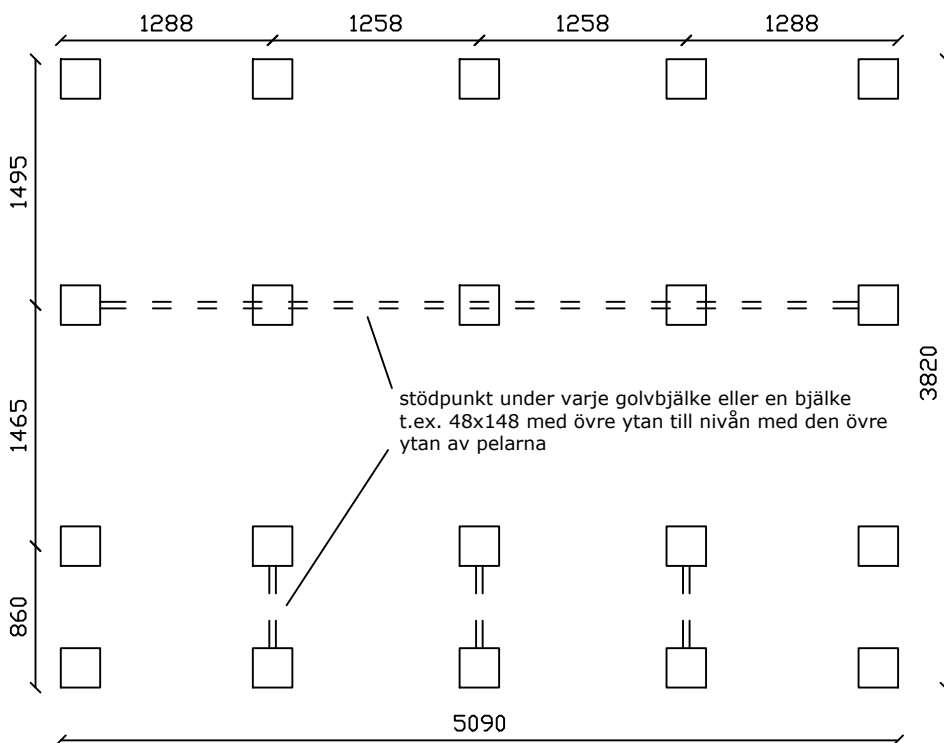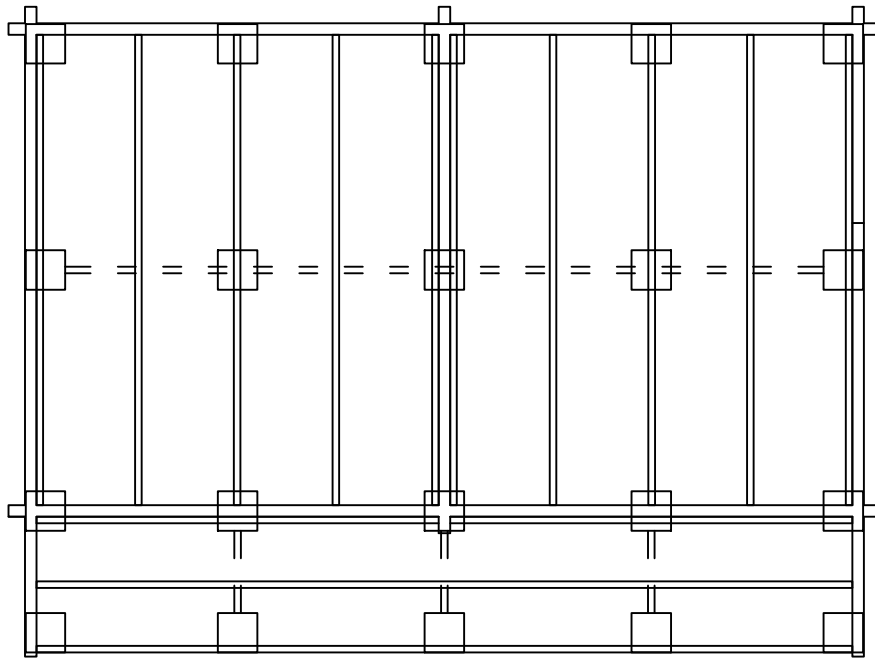

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com




proj.
Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
mått av plintgrund

skala
ej i skala

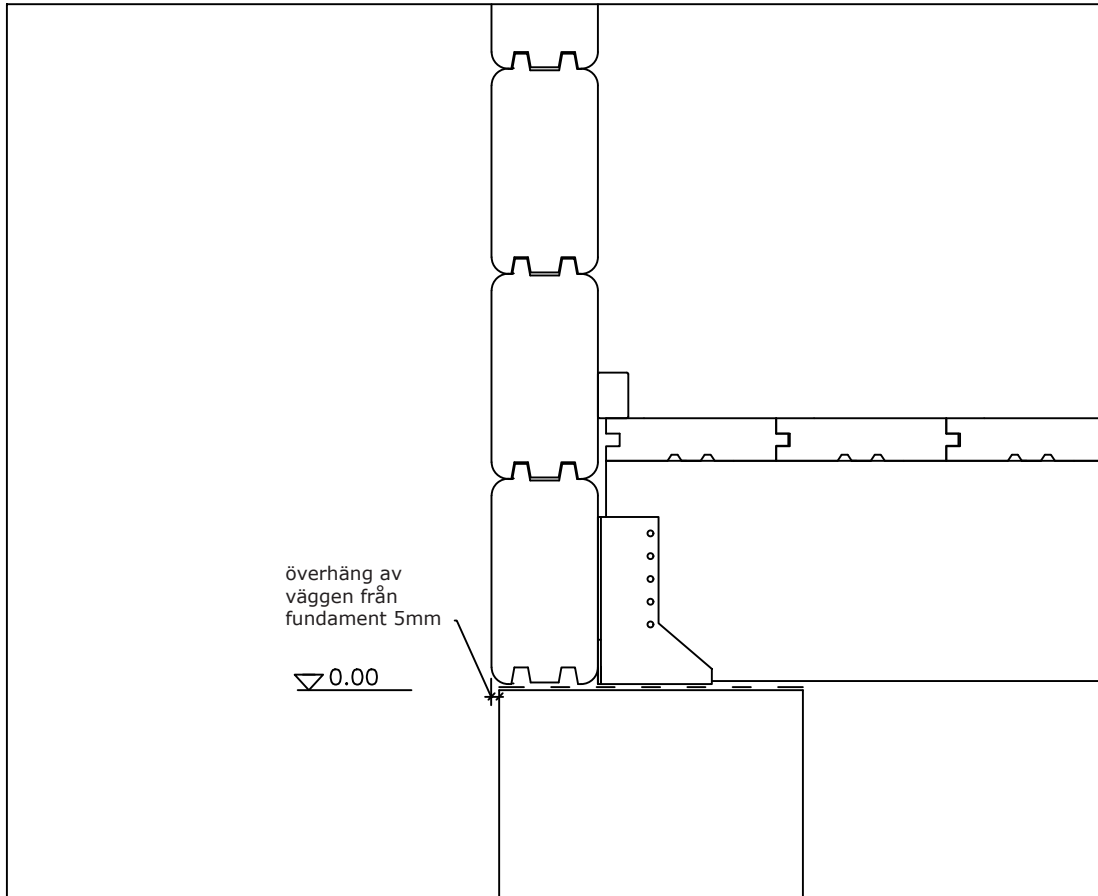

överhäng av
väggen från
fundament 5mm

▽ 0.00

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com




projekt
Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
överhäng av väggen

skala
ej i skala

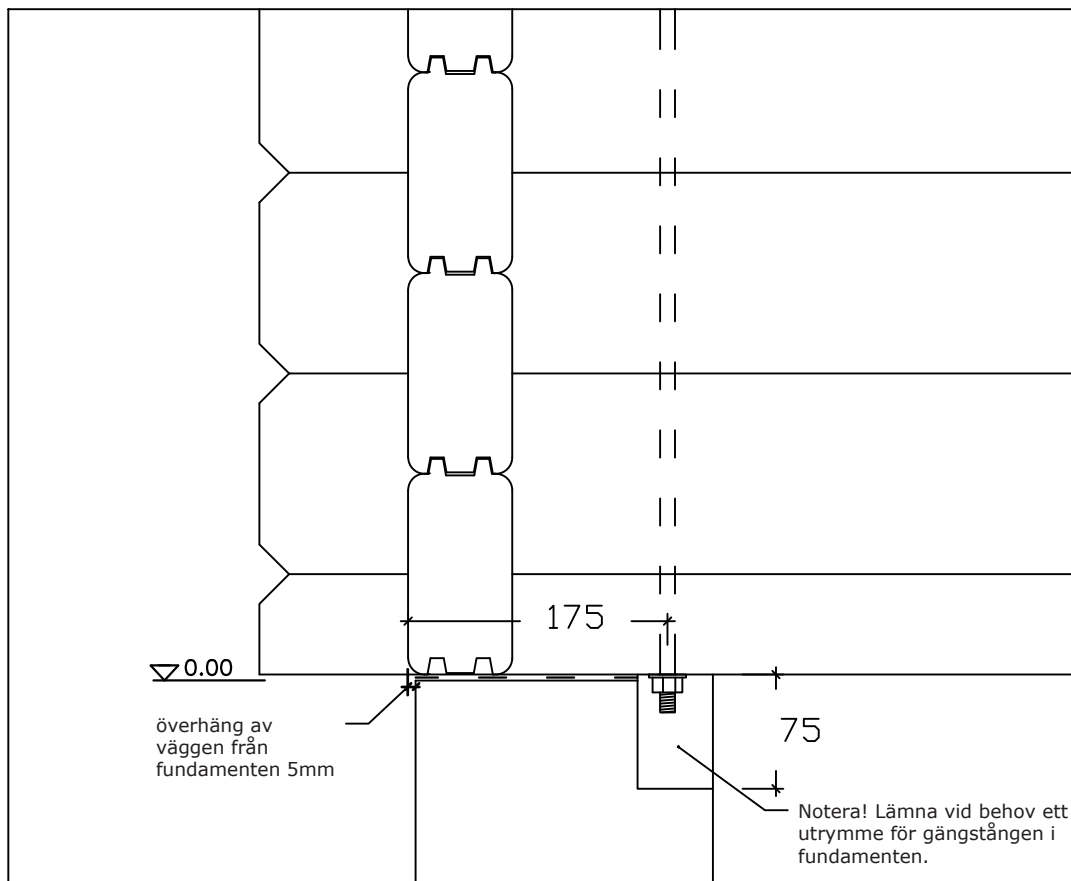

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com





projekt
 Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll

skala

överhäng av väggen, utrymme för gängstång ej i skala

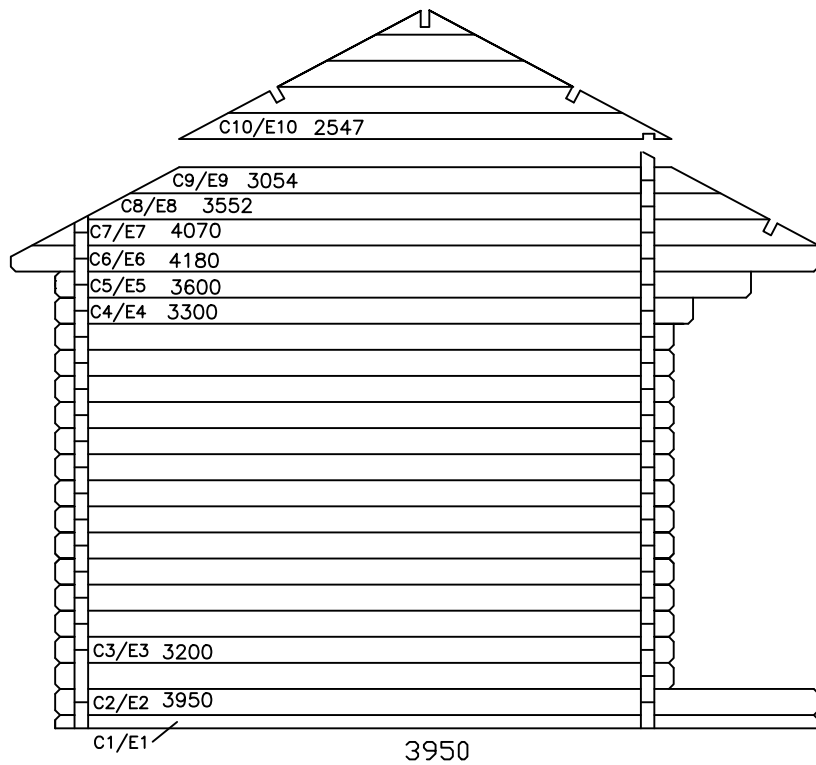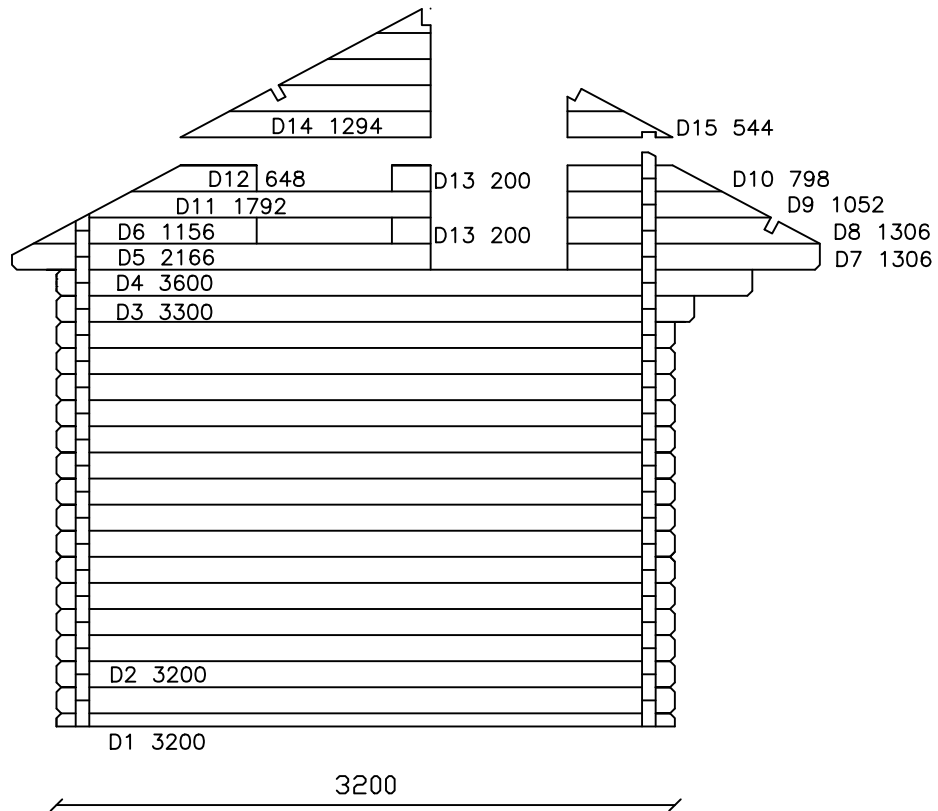

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com





projekt
 Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
 väggschema, vägg C, D och E

skala

ej i skala

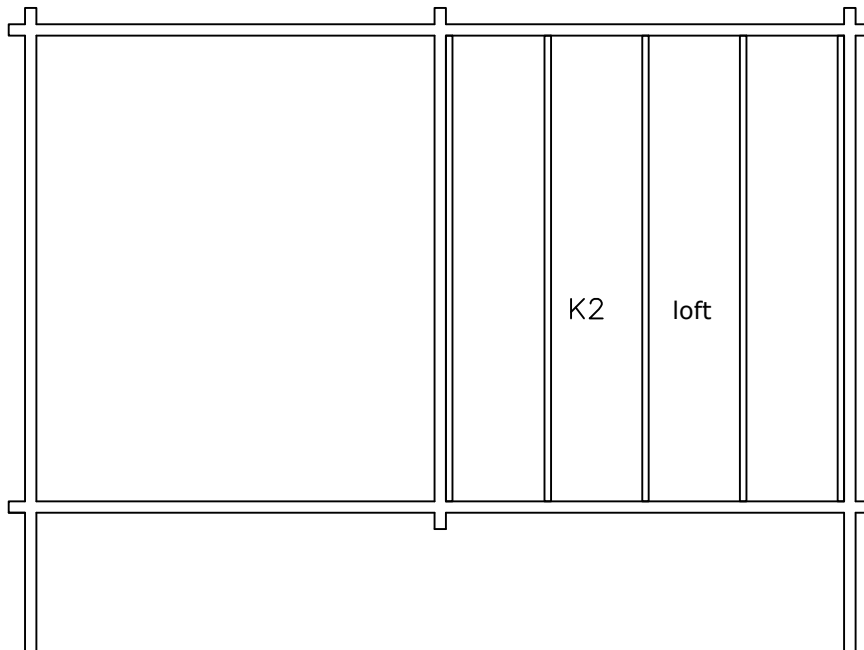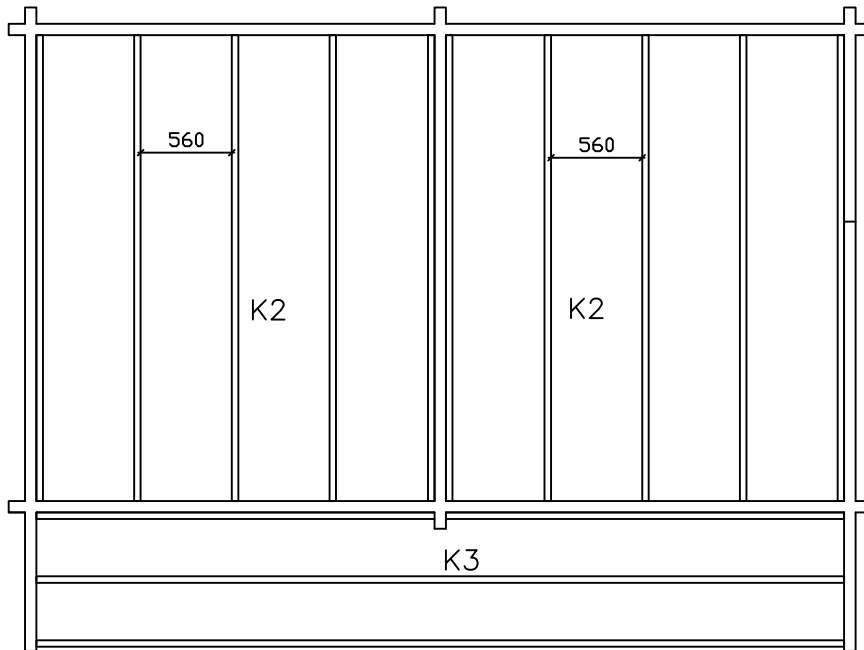

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com




projekt
 Luoman Tiainen 15P-2

datum

innehåll
 golvbjälklag och loftgolvbjälklag

skala

ej i skala

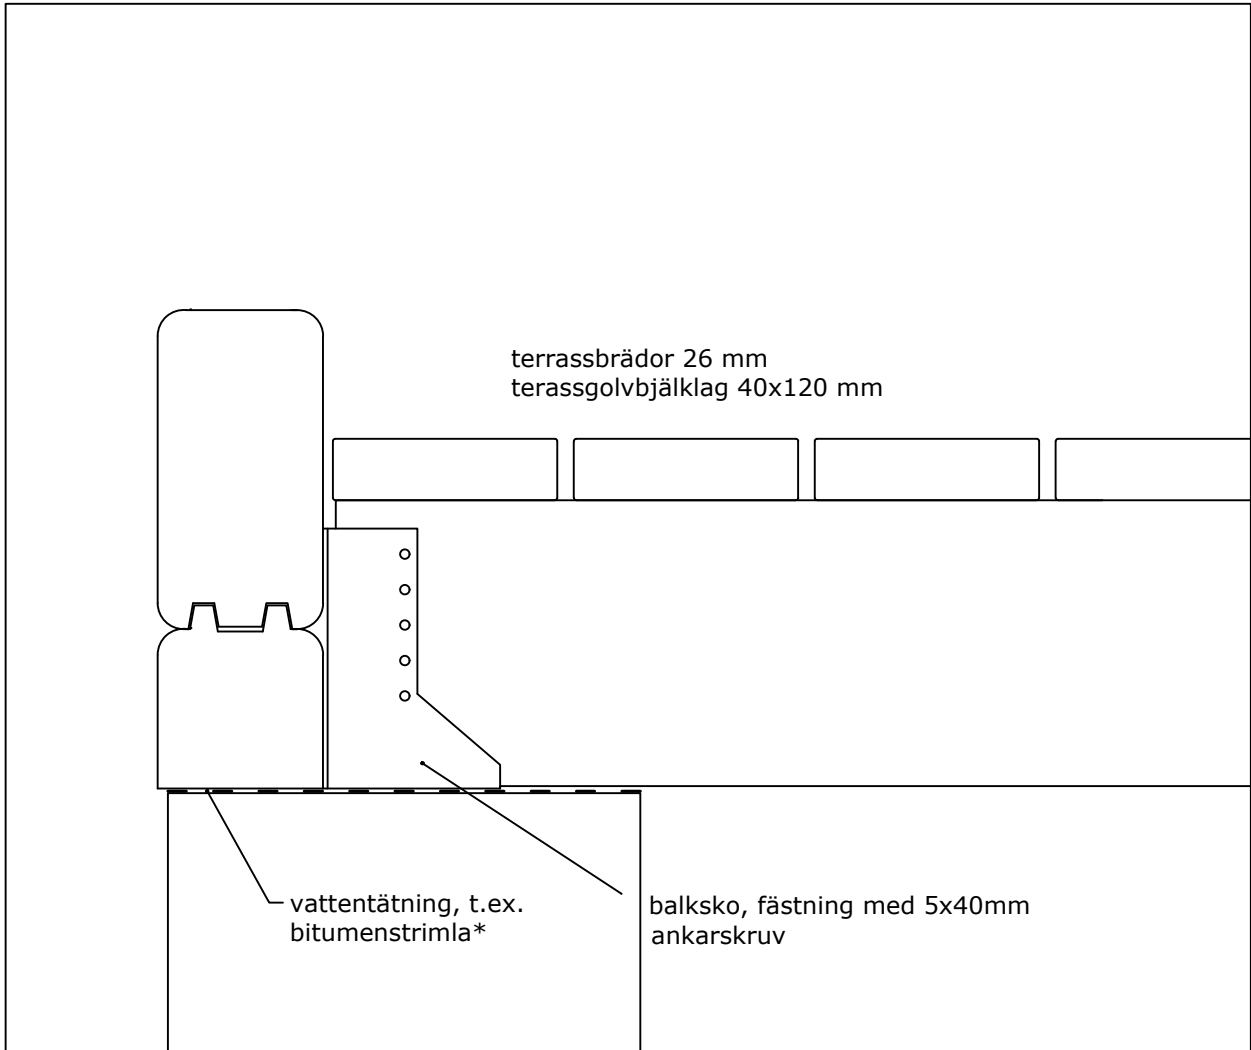

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com




projekt
Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
sektion, terrass

skala
ej i skala

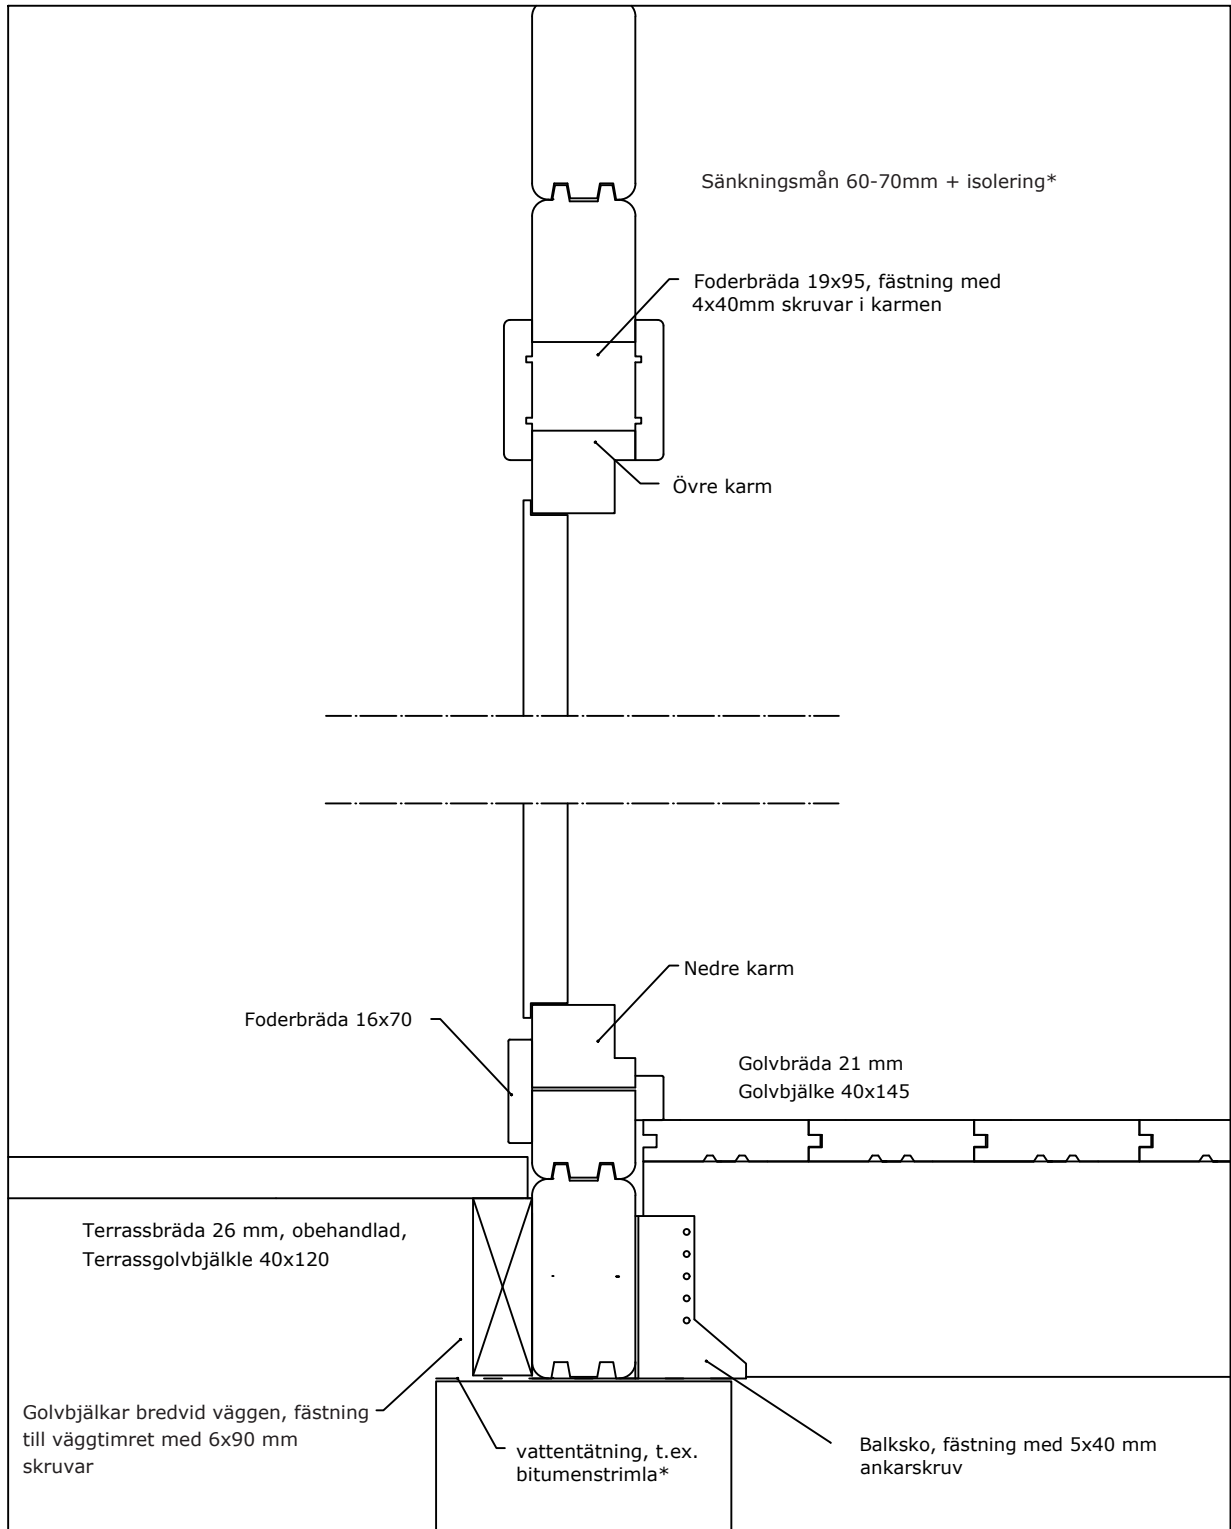

* ingår ej

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com




projekt
Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
princip, sektion, golvbjälke och dörr

skala
ej i skala

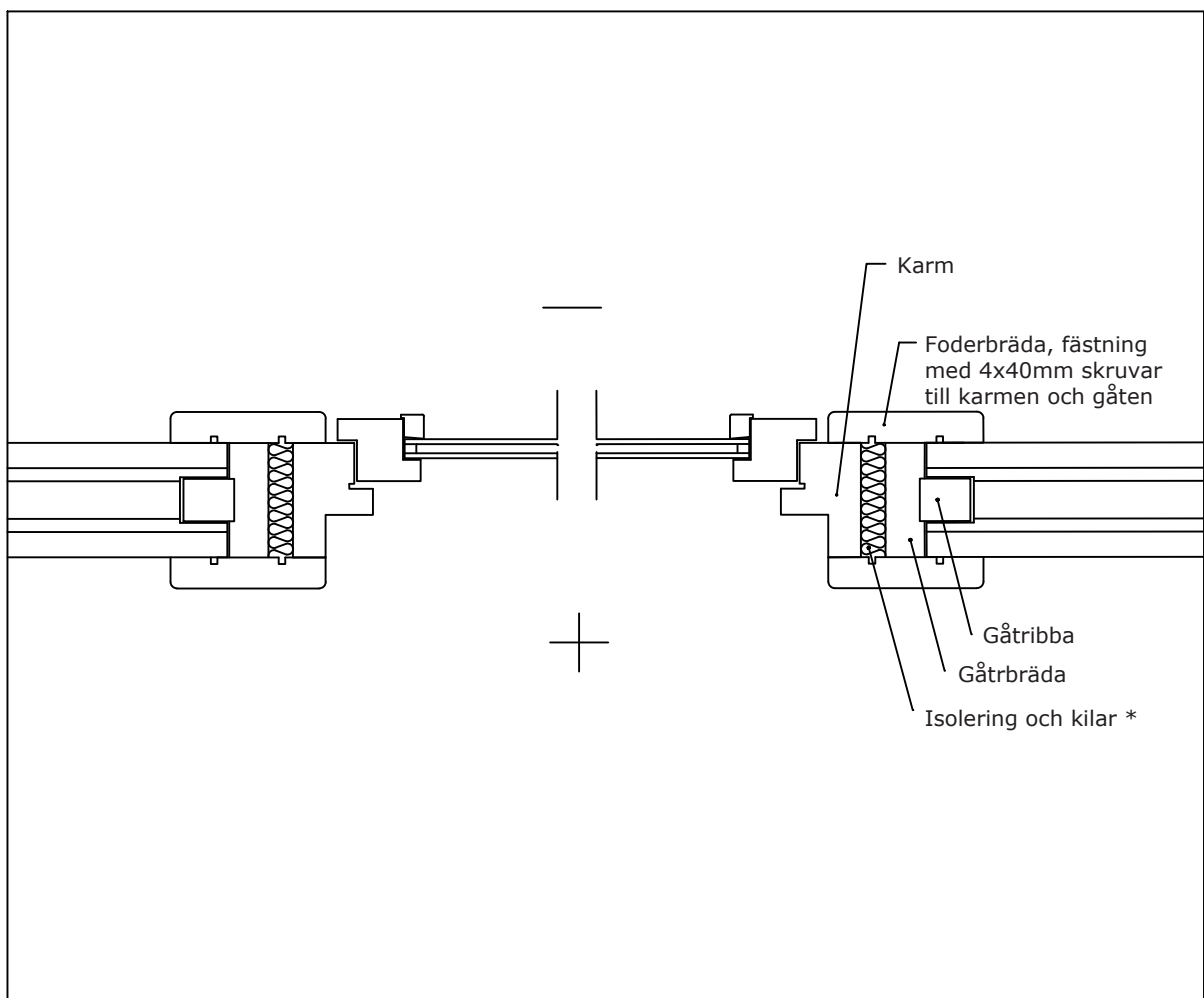

* ingår ej

Obs! Lämna tillräckligt med sättningsmån ovanför gåtribban och gåträdan!

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com




projekt datum

Luoman Tiainen 15P-2

inhåll skala

princip, sektion, fönster ej i skala

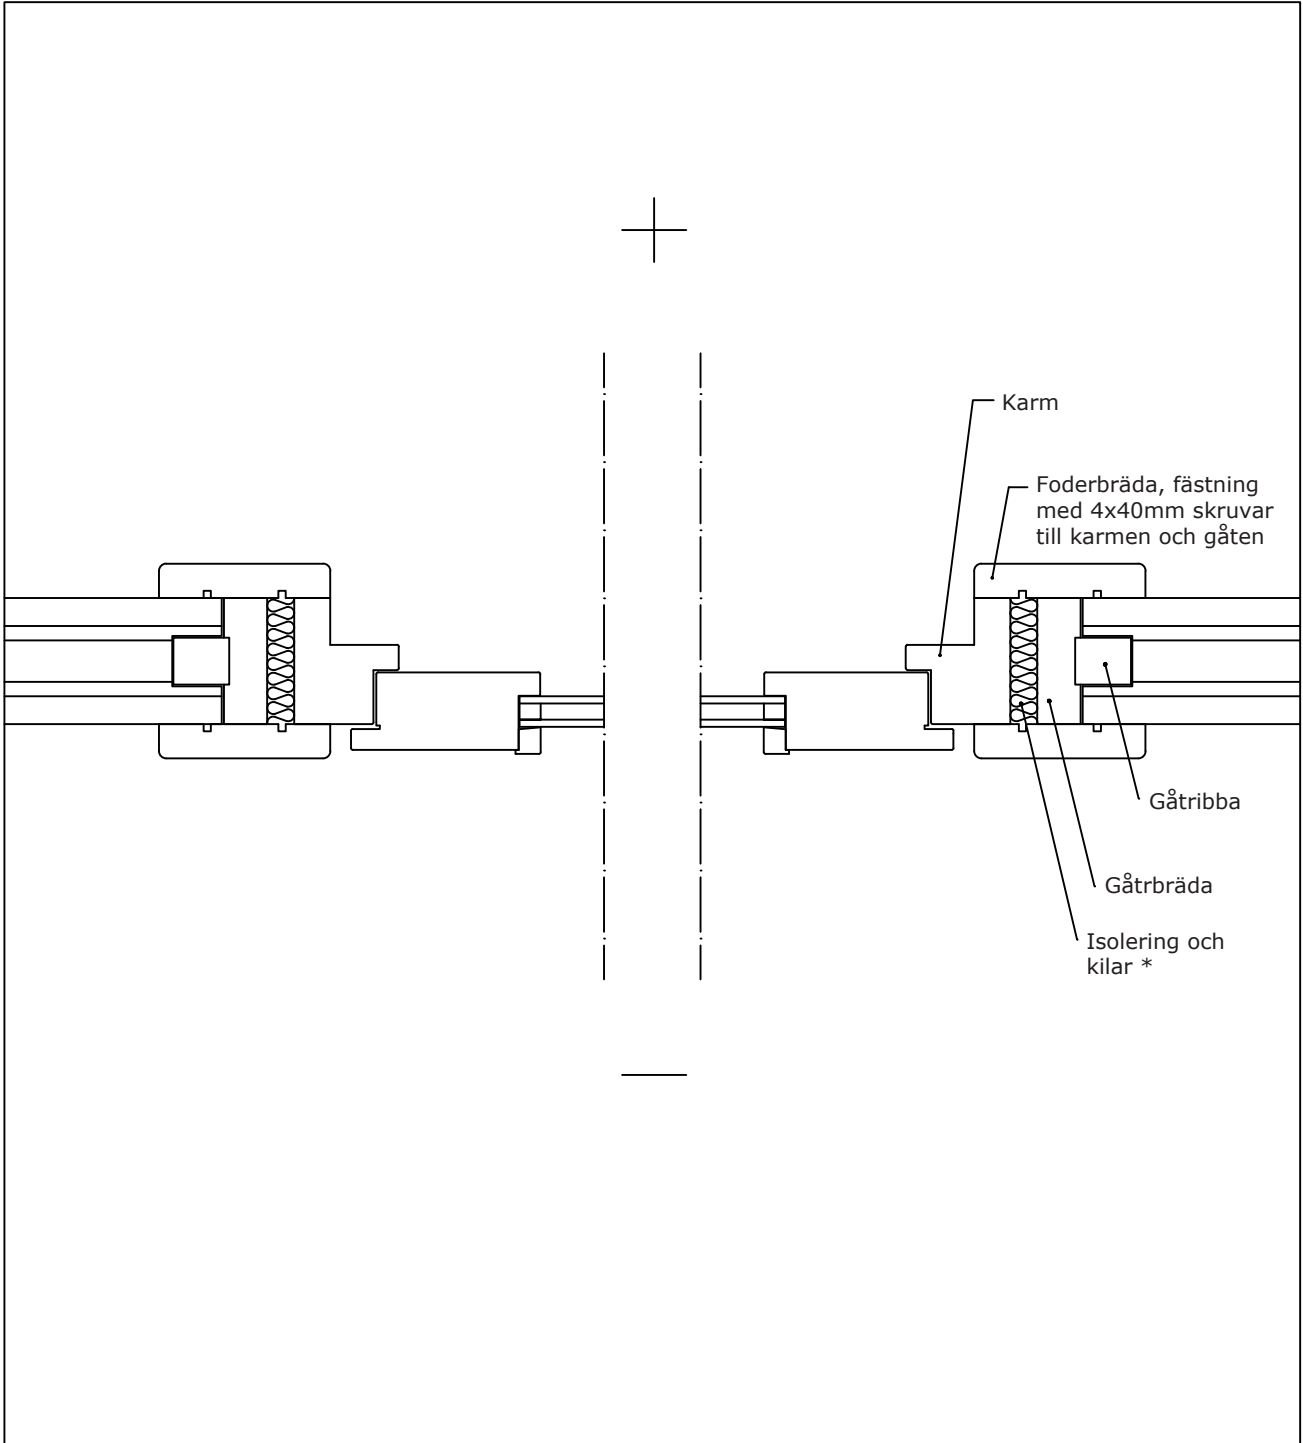

* ingår ej

Obs! Lämna tillräckligt med sättningsmån ovanför gåtribban och gåträdan!

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com



projekt
 Luoman Tiainen 15P-2


datum

innehåll
 princip, sektion, dörr

skala

ej i skala

Justering av dörrgångjärn

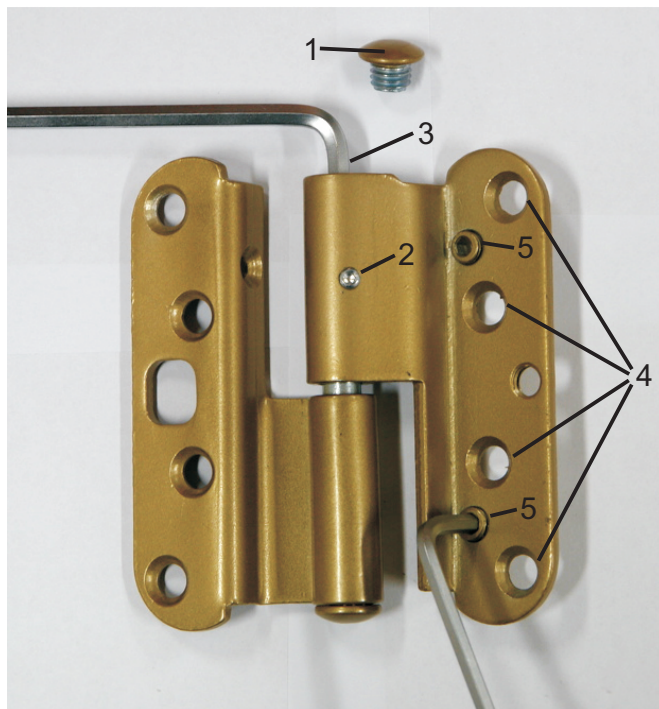

Höjjustering

Först skruva bort skyddshatten från gångjärnet (1). Sedan lös fästningsskruven om det finns en (2). Dörren lyfts uppåt genom att vända justeringsskruven medsols med en sexkantnyckel AV5 (3). Dörrens gångjärn justeras så att dem båda blir bärande. När justeringen är gjord spänn skruven (2) och skruva skyddshatten tillbaka (1).

Justering sidlänges

Först löses fästningsskruvarna av dörrbladens gångjärn med ett par varv (4). Dörren rör sig åt låssidan genom att vända justeringsskruvarna (5) med en sexkantnyckel AV4 motsols. Det är viktigt att justera alla skruvarna så att gångjärnsbladet kommer i rätt ställning. När justeringen är gjord spänn fästningsskruvarna (4) igen.

Luoman Puutuote Oy
www.lillevilla.com



projekt
Luoman Tiainen 15P-2

datum

inhåll
gångjärn

skala
ej i skala



Komponentlista

Luoman 15P-2 Tiainen

1/2

	Kod	Tjocklek	Bredd	Längd	St.	Kontroll
Golvbräda, nedre våning och loft	L1	21	87	2440	102	
Fotlist, taklist *	J1	20	30	52 jm		
Terrassbräda, obehandlad	L2	26	95	850	50	
Innertakspanel	KA2	16	87	1260	58	
Innertakspanel	KA3	16	87	1970	58	
Takbräda	KA1	21	87	2500	128	
Väggtimmer, borrat, med avfasning	B2	70	87	5500	1	
Väggtimmer, borrat, med avfasning	A9	70	135	5500	1	
Väggtimmer, borrat	A1,B1	70	135	5300	25	
Väggtimmer, borrat, urskärning för dörr	A2	70	135	5300	1	
Väggtimmer, borrat, spår för gåt	A3	70	135	1563	6	
Väggtimmer, spår för gåt	A4	70	135	900	13	
Väggtimmer, borrat, spår för gåt	A5	70	135	900	13	
Väggtimmer, borrat, spår för gåt	A6	70	135	433	7	
Väggtimmer, spår för gåt	A7	70	135	410	7	
Väggtimmer, borrat, urskärning för dörr	A8	70	135	5300	1	
Väggtimmer, innervägg D	D1	70	67	3200	1	
Väggtimmer, gavelväggar	C1,E1	70	67	3950	2	
Väggtimmer, gavelväggar C och E	C2,E2	70	135	3950	2	
Väggtimmer, gavelväggar C och E, innervägg D	C3,D2,E3	70	135	3200	43	
Väggtimmer, gavelväggar C och E, innervägg D	C4,D3,E4	70	135	3300	3	
Väggtimmer, gavelväggar C och E, innervägg D	C2,D4,E5	70	135	3600	3	
Väggtimmer, gaveltriangel	C6,E6	70	135	4180	2	
Väggtimmer, gaveltriangel	C7,E7	70	135	4070	2	
Väggtimmer, gaveltriangel	C8,E8	70	135	3552	2	
Väggtimmer, gaveltriangel	C9,E9	70	135	3054	2	
Gaveltriangel	C10,E10	70	690	2547	2	
Väggtimmer, gaveltriangel	D5	70	135	2166	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D6	70	135	1156	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D7	70	135	1306	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D8	70	135	1306	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D9	70	135	1052	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D10	70	135	798	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D11	70	135	1792	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D12	70	135	648	1	
Väggtimmer, gaveltriangel	D13	70	135	200	2	
Gaveltriangel	D14	70	650	1294	1	
Gaveltriangel	D15	70	250	544	1	
Extra väggtimmer för eventuell behov	T12	70	135	3200	1	

* som löpmeter, kapas på byggplats

Alla mått är cirka mått. Vi behåller rätten till tekniska modifikationer.



Komponentlista

2/2

Luoman 15P-2 Tiainen

	Kod	Tjocklek	Bredd	Längd	St.	Kontroll
Takbalk	K1	40	145	5500	4	
Golvbjälke och loftgolvbjälke 10+5 st.	K2	40	145	2850	15	
Terrassgolvbjälke	K3	40	120	4950	3	
Stödribba för lofttakbalk	K4	40	50	2443	1	
Fönster, typ E	I1		646	880	1	
Dörr, typ C10	O1		895	1820	2	
Takfotsbräda *	T1	19	95	2800	8	
Stöd till takfotsbräda *	T2	40	50	2800	4	
Spikningsläkt för innertakspanel *	T3	40	50	2450	8	
Ribba till gät *	T4	27	30	1800	5	
Bräda till gät *	T5	24	70	1850	5	
Foderbräda till dörr och fönster *	T6	19	95	3800	10	
Foderbräda till dörr och fönster *	T7	16	70	3800	1	
Taklist *	T8	16	45	2450	4	
Gängstång	T9	8		2500	5	
Tillbehör	T10				1	
Monteringsstycke	T11	70	65	250	2	

* som löpmeter, kapas på byggplats

Alla mått är cirka mått. Vi behåller rätten till tekniska modifikationer.
